

入 札 条 件

令和 7 年 9 月 16 日

工 事 名	令和 7 年度 町道半下石線道路改良工事
路 線 名	町道半下石線
位 置	錦江町馬場地内
工 事 期 間	自 令 和 7 年 11 月 4 日 至 令 和 8 年 3 月 23 日
工 事 金 支 払	完成払・前金払・中間前払
入 札 保 証 金	免除
交 通 止	現場監督者と協議の上決定する
材 料	検査合格の後使用する
支 給 材 料	無
延 滞 金	錦江町契約規則第 4 7 条に基づき徴収する
そ の 他	

令和 7 年度

錦江町 馬場地内

令和7年度 町道半下石線道路改良工事

閱 覧 設 計 書

現 場 説 明
現場説明は一括して行わないので 随時担当者から受けてください。

期 間 140 日 間
令 和 8 年 3 月 23 日 限 り

鹿兒島県肝属郡

令和7年度 町道半下石線道路改良工事位置図



工事箇所

凡 例

[illegible]

附 表

項目	單位	數量	備註
1. 總計	合計	10000	
2. 分項	分項	10000	
3. 分項	分項	10000	
4. 分項	分項	10000	
5. 分項	分項	10000	
6. 分項	分項	10000	
7. 分項	分項	10000	
8. 分項	分項	10000	
9. 分項	分項	10000	
10. 分項	分項	10000	
11. 分項	分項	10000	
12. 分項	分項	10000	
13. 分項	分項	10000	
14. 分項	分項	10000	
15. 分項	分項	10000	
16. 分項	分項	10000	
17. 分項	分項	10000	
18. 分項	分項	10000	
19. 分項	分項	10000	
20. 分項	分項	10000	
21. 分項	分項	10000	
22. 分項	分項	10000	
23. 分項	分項	10000	
24. 分項	分項	10000	
25. 分項	分項	10000	
26. 分項	分項	10000	
27. 分項	分項	10000	
28. 分項	分項	10000	
29. 分項	分項	10000	
30. 分項	分項	10000	
31. 分項	分項	10000	
32. 分項	分項	10000	
33. 分項	分項	10000	
34. 分項	分項	10000	
35. 分項	分項	10000	
36. 分項	分項	10000	
37. 分項	分項	10000	
38. 分項	分項	10000	
39. 分項	分項	10000	
40. 分項	分項	10000	
41. 分項	分項	10000	
42. 分項	分項	10000	
43. 分項	分項	10000	
44. 分項	分項	10000	
45. 分項	分項	10000	
46. 分項	分項	10000	
47. 分項	分項	10000	
48. 分項	分項	10000	
49. 分項	分項	10000	
50. 分項	分項	10000	
51. 分項	分項	10000	
52. 分項	分項	10000	
53. 分項	分項	10000	
54. 分項	分項	10000	
55. 分項	分項	10000	
56. 分項	分項	10000	
57. 分項	分項	10000	
58. 分項	分項	10000	
59. 分項	分項	10000	
60. 分項	分項	10000	
61. 分項	分項	10000	
62. 分項	分項	10000	
63. 分項	分項	10000	
64. 分項	分項	10000	
65. 分項	分項	10000	
66. 分項	分項	10000	
67. 分項	分項	10000	
68. 分項	分項	10000	
69. 分項	分項	10000	
70. 分項	分項	10000	
71. 分項	分項	10000	
72. 分項	分項	10000	
73. 分項	分項	10000	
74. 分項	分項	10000	
75. 分項	分項	10000	
76. 分項	分項	10000	
77. 分項	分項	10000	
78. 分項	分項	10000	
79. 分項	分項	10000	
80. 分項	分項	10000	
81. 分項	分項	10000	
82. 分項	分項	10000	
83. 分項	分項	10000	
84. 分項	分項	10000	
85. 分項	分項	10000	
86. 分項	分項	10000	
87. 分項	分項	10000	
88. 分項	分項	10000	
89. 分項	分項	10000	
90. 分項	分項	10000	
91. 分項	分項	10000	
92. 分項	分項	10000	
93. 分項	分項	10000	

項目	單位	數量	備註
1. 總計	合計	10000	
2. 分項	分項	10000	
3. 分項	分項	10000	
4. 分項	分項	10000	
5. 分項	分項	10000	
6. 分項	分項	10000	
7. 分項	分項	10000	
8. 分項	分項	10000	
9. 分項	分項	10000	
10. 分項	分項	10000	
11. 分項	分項	10000	
12. 分項	分項	10000	
13. 分項	分項	10000	
14. 分項	分項	10000	
15. 分項	分項	10000	
16. 分項	分項	10000	
17. 分項	分項	10000	
18. 分項	分項	10000	
19. 分項	分項	10000	
20. 分項	分項	10000	
21. 分項	分項	10000	
22. 分項	分項	10000	
23. 分項	分項	10000	
24. 分項	分項	10000	
25. 分項	分項	10000	
26. 分項	分項	10000	
27. 分項	分項	10000	
28. 分項	分項	10000	
29. 分項	分項	10000	
30. 分項	分項	10000	
31. 分項	分項	10000	
32. 分項	分項	10000	
33. 分項	分項	10000	
34. 分項	分項	10000	
35. 分項	分項	10000	
36. 分項	分項	10000	
37. 分項	分項	10000	
38. 分項	分項	10000	
39. 分項	分項	10000	
40. 分項	分項	10000	
41. 分項	分項	10000	
42. 分項	分項	10000	
43. 分項	分項	10000	
44. 分項	分項	10000	
45. 分項	分項	10000	
46. 分項	分項	10000	
47. 分項	分項	10000	
48. 分項	分項	10000	
49. 分項	分項	10000	
50. 分項	分項	10000	
51. 分項	分項	10000	
52. 分項	分項	10000	
53. 分項	分項	10000	
54. 分項	分項	10000	
55. 分項	分項	10000	
56. 分項	分項	10000	
57. 分項	分項	10000	
58. 分項	分項	10000	
59. 分項	分項	10000	
60. 分項	分項	10000	
61. 分項	分項	10000	
62. 分項	分項	10000	
63. 分項	分項	10000	
64. 分項	分項	10000	
65. 分項	分項	10000	
66. 分項	分項	10000	
67. 分項	分項	10000	
68. 分項	分項	10000	
69. 分項	分項	10000	
70. 分項	分項	10000	
71. 分項	分項	10000	
72. 分項	分項	10000	
73. 分項	分項	10000	
74. 分項	分項	10000	
75. 分項	分項	10000	
76. 分項	分項	10000	
77. 分項	分項	10000	
78. 分項	分項	10000	
79. 分項	分項	10000	
80. 分項	分項	10000	
81. 分項	分項	10000	
82. 分項	分項	10000	
83. 分項	分項	10000	
84. 分項	分項	10000	
85. 分項	分項	10000	
86. 分項	分項	10000	
87. 分項	分項	10000	
88. 分項	分項	10000	
89. 分項	分項	10000	
90. 分項	分項	10000	
91. 分項	分項	10000	
92. 分項	分項	10000	
93. 分項	分項	10000	

令和7年度 町道半下石線道路改良工事
現況写真

起点側より



終点側より



特 記 仕 様 書

1. 工 事 名 令和7年度 町道半下石線道路改良工事
2. 河 川 名 町道半下石線
3. 工 事 箇 所 錦江町 馬場地内
4. 工 期 令和7年11月4日 ～ 令和8年3月23日 (140日間)
5. 工 事 工 種 道路改良工事

第1章 総則

- 第1条 本工事はこの特記仕様書によるほか鹿児島県土木部制定(土木工事共通仕様書)(アスファルト舗装工事共通仕様書)によること。
- 第2条 本工事の数量は、別紙「本工事内訳書」「明細書」「仕様図面」のとおりとする。尚この数量が相違する場合、請負者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
- 第3条 請負者は測量・調査・出来形管理・検査等のため専属して経験のある技術者を常置し、監督職員の要求及び指示に従わなければならない。
- 第4条 請負者は、錦江町契約規則第3条により工事契約締結後7日以内に設計図書に基づいて工程表を提出しなければならない。
- 第5条 請負者は、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設または測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあつてはそれを含む)の初日に工事着手届を提出しなければならない。
- 第6条 請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
- 第7条 本工事の工期は上記記載のとおりとする。

第2章 入札及び契約に関すること

- 第8条 (入札に記入する金額)
入札金額は契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
- 第9条 (入札保証金)
本工事は錦江町契約規則第5条により、見積もる契約金額の100分の5以上の額を納付しなければならない。ただし、錦江町契約規則第8条の規程に該当する者は免除とする。
- 第10条 (契約保証金)
本工事は錦江町契約規則第34条により契約金額の100分の10以上の金銭的保証が必要である。ただし、錦江町契約規則第37条の規程に該当する場合は免除とする。
- 第11条 (前払金)
第1項 本工事の請負契約金額が500万円以上の場合は、請負契約金額の40%以内で前払金を支払う事ができる。
第2項 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに要する経費については、前項の規定により既にした前金払に追加して、契約金額の20%以内において、前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(3) 工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること。
第3項 前金払を受けようとする請負者は、錦江町公共工事の前金払等に関する事務処理要綱により契約締結の日から30日以内に保証事業会社の保証書を添えて請求しなければならない。
- 第12条 (建設業退職金共済制度)
本工事の契約締結時には、建設業退職金共済制度に加入し掛金収納書を提出すること。
- 第13条 (検査)
工事検査を実施するに当たり、請負者はその工事に関し請負者があらかじめ現場代理人として指定した者及び主任技術者を立会させなければならない。
- 第14条 (週休2日)試行工事)
試行に当たっては、鹿児島県の『「週休2日」試行工事实施要領』に準じて行うものとする。なお、4週8休とは、対象期間内「月単位」における現場閉所率の割合が28.5%以上の水準であり、毎月「休日取得計画実績表」を提出すること。

第3章 建設工事の適正な施工の確保

- 第15条
第1項 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- 第2項 建設業法第26条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者、又は専任の監理技術者については、適切な資格技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る)を配置すること。
- 第3項 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない選任の監理技術者のうち当該建設工事に係わる建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第15条第2号イに該当するもの、又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げるものと同等以上の能力を有すると認定した者で、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、監理技術者資格者証の写しを添付すること。
- 第4項 1、2、及び3のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
- 第16条 (配置技術者等の途中交代)
第1項 配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、または退職等、真にやむを得ない場合のほか、下記に該当する場合である。
①受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
- 第2項 上記1のいずれの場合であっても、請負者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。
- 第17条 (現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合)
第1項 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合
現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下のいずれかの要件を満たす場合に、工事請負契約書第10条第3項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」として取り扱うものとする。ただし、いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や、現場保全の義務(現場の巡回等)があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。
- (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - (2) 工事契約書第20条により工事が一時中止されている期間
 - (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。また、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの製作を一括して運営、取締りを行うことができるものとする。
 - (4) 前3号に掲げる期間のほか、請負者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間
- 第2項 発注者への報告
上記第1項の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事と兼務することを可能とするが、「工事打合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。
- 第18条 (現場代理人の兼任)
第1項 現場代理人の兼任を認める工事
現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であるが、次の(1)から(5)のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。
- (1) 兼任できる工事は3件
 - (2) 工事の当初請負代金額の合計が8、000万円未満であること
 - (3) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
 - (4) 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
 - (5) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること
- 第2項 手続き
現場代理人の兼任を行う場合には、兼任(変更)申請書(別紙1)を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等選任(変更)通知書により、発注者に通知すること。なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。
- 第3項 受注者に対する措置請求
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

- 第4項 適用期間
兼任を認める工事の適用期間については、鹿児島県に準ずる。
- 第19条 施工体制台帳の作成等について
本工事の受注者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。
- 第20条 施工体系図の作成に等について
本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部または以下のアからエの業務を下請けに付する場合は、施工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事または業務の着手前までに)提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について、作成し提出すること。なお、建設工事下請通知書の提出は、施工体制台帳提出義務の拡大に伴い、廃止とする。
- 第21条 (暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置)
錦江町が発注する建設工事等(以下「町工事等」という。)において、暴力団関係者による不当要求または工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく町(発注者)及び警察に通報すること。
町工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、町(発注者)と協議を行うこと。

第4章 建設リサイクルについて

- 第22条 本工事は、建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象建設工事であるため、契約書「6 解体工事に要する費用等」を記載することとし、落札後速やかにこれに係る事前協議を行うこととする。請負者は協議に際して、説明書(別紙添付資料)並びに処理施設の許可書の写しを提出すること。
- 第23条 本工事は、建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象建設工事でないため、「6 解体工事に要する費用等」の欄は該当なしとする。
- 第24条 建設工事の施工により発生する指定副産物は、全て工事現場から40km以内の最寄りの再資源化施設へ搬出するものとする。尚、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により上記により難しい場合は、監督職員と協議の上の指示によること。
- 第25条 (現場発生土)
~~一指定処分A~~
第1項 ~~施工により発生する土砂類は下記により搬出すること。~~
(1) ~~受け入れ場所： 3Km~~
(2) ~~仮 置 き 等：必要な場合はその場所を明記する。~~
第2項 ~~錦江町が発注する全ての工事は、資源利用促進計画を作成し施工計画書に含めて提出すること。~~
第3項 ~~処分状況等の記録を完成書類に含めて提出すること。~~
第4項 建設工事発注後にやむを得ない事業により上記の指定により難しい場合は監督職員と協議の上、その指示によること。
- 指定処分B
第1項 工事により発生する土砂・岩塊は下記により搬出すること。
(1) 運 搬 距 離： 3Km
(2) 仮 置 き 等：必要な場合はその場所を明記する。
第2項 錦江町が発注する全ての工事は、資源利用促進計画を作成し施工計画書に含めて提出すること。
第3項 処分状況等の記録を完成書類に含めて提出すること。
第4項 建設工事発注後にやむを得ない事業により上記の指定により難しい場合は監督職員と協議の上、その指示によること。

第5章 工事の施工

- 第26条 (準備工)
第1項 工事着手前に工事区間の伐開を先行すること。
第2項 工事着手前に事前測量を行い、法線・縦断・横断・基準高等を設計図面と照合しその結果は内容の有無に関係なく監督職員に報告書を提出し協議すること。また設計図書に明記しなくても、構造上必要なものは全て監督職員と協議しその指示に従うこと。

- 第27条 事前測量の折、工事幅だけではなく用地幅の確認等も行い監督職員と連携を取りながら地権者とのトラブルのないように十分留意すること。
- 第28条 工事着工前に全工事区間の丁張を設置し、監督職員の承認を得てから着手すること。
- 第29条 (工事中における事故防止)
- 第1項 労働災害防止対策のため作業員の点検指示を的確に行うとともに、工事中の労働災害の未然防止につとめること。
- 第2項 工事車両の交通事故防止に努めるとともに、工事区間の標識板の掲示等を適切に行い交通の安全かつ円滑な対応に努めること。
- 第30条 (ダンプトラック等による過積載防止)
- (1) 工食用資材等の積載超過のないようにすること。
- (2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
- (3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。
- (4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。
- (5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法」(以下法という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
- (6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
- (7) (1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
- 第31条 (手摺先行型枠組足場)
- 枠組足場の設置を必要とする場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省平成15年4月)」によるものとし、手摺先行型枠組足場は二段手摺、幅木の機能を有するものでなければならない。なお、これによりがたい場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。
- 第32条 (排出ガス対策型建設機械の使用について)
- 本工事において以下の対象機種を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械または「排出ガス浄化装置」装着機械の使用を原則とする。ただし、①リース業者等が対策型建設機械を供給できない場合、②自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用することが妥当でない場合等は、監督職員との協議により、未対策型建設機械を使用してもよいものとする。ただし、設計変更の対象とする。
- (1)バックホー (2)ホイールローダー (3)ブルドーザ (4)発動発電機 (5)空気圧縮機
(6)油圧ユニット (7)ローラ類 (8)ラフテレーンクレーン
- なお、排出ガス対策型建設機械または「排出ガス浄化装置」装着機械の使用の有無を施工計画書に明示し、工事完成図書に写真を添付すること。
- 第33条 (低騒音型建設機械の使用の原則化について)
- 本工事は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和62年3月30日建設省経機発第58号)に基づき「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」(平成9年建設省告示第1536号)により指定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。なお、低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示し、工事完成図書に写真を添付すること。
- 第34条 (県産資材の優先使用について)
- (1) 工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。)の優先使用に努めることとし、さらに県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。
- (2) 請負業者は、「材料使用承認願」において、全ての資材について県産資材使用の有無を記載するとともに、以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督員に提出し、承諾を得なければならない。
- | | |
|-----------------|---|
| 指定主要資材
(7品目) | 生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品
石材類 アスファルト合材 木材 樹木 芝 |
|-----------------|---|
- (3) 前項で定めた不使用状況報告書において、第1項で定めた資材業者等から調達しない場合は、その理由を記載すること。
- (4) 請負業者は、工事完成時及び監督員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」を監督員に提出すること。
- 第35条 (町内建設業者の優先活用について)
- (1) 請負業者は、工事の一部を下請けに付する場合は、町内に本店を置く業者を使用するよう努めることとする。
- (2) 請負業者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督員に提出すること。
- (3) 請負業者は、工事完成時及び監督員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督員に提出すること。

第6章 そ の 他

- 第36条 (地籍調査図根点及び筆界杭等の保護)
- 第1項 地籍調査完了区域内を工事施工する場合は、事前に税務課地籍係と連絡調整を図ること。
- 第2項 地籍調査完了区域内にある図根点等は、高度な技術と精度を確保できる測量法により復元すること。
- 第3項 復元後、移設前後の写真(移設点及び控え杭が確認できるもの)を添付の上、住民生活課地籍係に提出し検査・検測をうけること。
- 第37条 (その他)
- 第1項 工事着手前に本工事によって影響を受ける恐れのある地域内の地物の事前調査を行うこと。
- 第2項 工事現場周辺に対しては、騒音・振動等を極力少なくする他、散水その他飛散塵介の出ないように処理すること。
- 第3項 工事着手前に地下埋設物の支障物件(電力管・上水道管・NTT管等)の有無を、占用する施設管理者に確認すること。また、掘削にあたっては、埋設物管理者の立ち会いを求め、埋設位置・埋設深度を確認するとともに、架空物件(地域放送線・電力線・電話線)についても、工事着手まえに各施設管理者と施工方法を協議すること。
- 第4項 工事施行の際使用した官民地の跡地整理を行うこと。
- 第5項 工事着手前に道路工事作業申請書(警察署・消防署)を提出すること。また、通行止めをする場合は事前に監督職員と協議すること。
- 第6項 工事着手前に必ず、関係自治会及び地権者に対し、工事内容・工事期間等の連絡をすること。
- 第38条 工事の一部を下請けに付する場合は、あらかじめ、その承諾を受けること。その場合、下請負人の商号又は名称、請負金額その他必要な事項を記載した通知書を提出すること。

第7章 提出書類

- 第39条 電子納品
- 第1項 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「鹿児島県電子納品ガイドライン(案)(令和5年3月):(以下、「ガイドライン」という。)」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。
- 第2項 ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(原則CD-R)で正本1部、副本1部の計2部提出する。電子化しない成果品については従来どおりの取扱とする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。
- 第3項 本工事の工事番号は「 4902025110411 」とする。
- 第40条 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出
- 本工事の施工により発生する産業廃棄物については、処分状況等の記録(E票の写し及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表)を工事完成図書に添付すること。なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、E票が処分業者より返送されていない場合は、A票、B2票及びD票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。
- ただし、この場合においても、最終処分が完了し、E票が処分業者より返送され次第、直ちに同票の写しを提出すること。
- 第41条 本工事設計書で使用している資材単価は、鹿児島県土木部発行平成7年度公共事業設計単価表に記載されているもの以外の単価根拠は下記のとおりである。

資材名	規格	区分	単価	備 考

(別紙1)

令和 年 月 日

契約担当者 殿

請負者
商号又は名称
代表者の氏名 印

現場代理人の兼任（変更）申請書

下記工事について、現場代理人を兼任したいので（変更）申請します。

なお、両工事の施工に当たっては、関係法令等を遵守し、安全管理及び工程管理に留意します。

現 場 代 理 人 氏 名		連 絡 先	
兼 任 す る 工 事 (申 請 工 事)	工 事 名		
	工 事 場 所		
	工 期		
	請 負 金 額 (税 込 み)		
	現 場 代 理 人 不 在 の 間 の 緊 急 連 絡 先	氏 名 連 絡 先	
兼 任 す る 工 事	工 事 名		
	工 事 場 所		
	工 期		
	請 負 金 額 (税 込 み)		
	発 注 機 関 名		
	監 督 員 氏 名		
	発 注 機 関 の 連 絡 先		
兼 任 す る 工 事	工 事 名		
	工 事 場 所		
	工 期		
	請 負 金 額 (税 込 み)		
	発 注 機 関 名		
	監 督 員 氏 名		
	発 注 機 関 の 連 絡 先		

※添付書類：兼任する工事の当初契約書（写し）
兼任する工事の承認を得た場合は、写しを後日提出すること

産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表

令和 年 月 日

工	事	名	:
工	事	場	所
請	負	者	名
現	場	代	理
人	氏	名	:

品目名									
番号	交付年月日	交付番号	数量	単位	収集・運搬業者の名称	処分業者の名称	最終処分終了日	E票確認日	備考
合計									

- ※ : 1 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 収集業者と運搬業者、中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は、適宜項目を追加し作成すること。
3 E票が処分業者より返送されていない場合は、直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。

下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書

工	事	名	:
請	負	者	名

下請階層	建設業者名	住所 (県・市町村名)	区分	下請工事 概要	不活用理由	
					番号	具体的理由

下請業者使用実績報告書

工	事	名	:
請	負	者	名

元請業者 区分	最終請負 金額 (千円)	全下請業者使用状況				階層別下請使用状況															
		総数	下請業者内訳			下請 階層	管内		管外(県内)		不活用理由				県外		不活用理由				
			管内	管外 (県内)	県外		業者数	契約金額	業者数	契約金額	①	②	③	④	業者数	契約金額	①	②	③	④	
						一次															
						二次															
						三次															
						四次															
						五次															
						小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(別紙3)

説 明 書

令和 年 月 日

錦江町長
新 田 敏 郎 殿

住 所
氏 名
連絡先

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により
対象建設工事の分別解体等の計画等に係る事項について説明します。

記

1. 工事の名称
2. 工事の場所
3. 説明内容 添付資料のとおり
4. 添付資料
 - ①別表(別表1～3のうち該当するものに必要事項を記載したもの)
 - ☐別表1(建築物に係る解体工事)
 - ☐別表2〔建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)〕
 - ☐別表3〔建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)〕
 - ②工程の概要を示す資料(できるだけ図面、表等を利用する。)

(ア) 欄には、該当個所に「レ」を付すること。

(別表4)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等				
工作物の種類 (解体工事のみ)*		☐ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他()		
工事の種類		☐ 新築工事 ☐ 維持・修繕工事 ☐ 解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ その他()		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)*		☐ コンクリート ☐ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☐ アスファルト・コンクリート ☐ 木材		
工作物に関する調査の結果		工 作 物 の 状 況		
		周 辺 状 況		
		作 業 場 所 の 状 況		
		搬出経路の状況		
		付着物の有無(解体・維持・修繕工事のみ)		
工事着手前に実施する措置の内容		そ の 他 ()		
		作 業 場 所 の 確 保		
		搬 出 経 路 の 確 保		
そ の 他 ()				
工事着手の時期*		令和 年 月 日		
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事	☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事	☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事	☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事	☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事	☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事	☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序		
		☐ その他()		
		その他の場合の理由()		
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)*		トン		
廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・欠いた移行時のみ)	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分又は使用する部分(注)
		☐ コンクリート塊	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
		☐ アスファルト・コンクリート塊	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
	☐ 建設発生木材	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥	
(注)①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				

* 以外の事項は法第9条第2項の基準に適合するものでなければなりません。

(イ) 欄には、該当個所に「レ」を付すること。

(別紙5)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

1. 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法(※)
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(ア)「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

2. 解体工事に要する費用(直接工事費)

円(税抜き)

- (注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。

3. 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地

4. 再資源化等に要する費用(直接工事費)

円(税抜き)

- (注) ・運搬費を含む。

休日取得計画実績表

【記入例】

工事名 : ○○○○工事(○○○○2-○工区)
 工事着手日 : 令和6年5月27日
 工事完成届出日(予定) : 令和7年1月29日 工事期間 : 248日間

	対象期間	閉所日数	閉所率
計画	239	69	28.9%
実績	239	70	29.3%

休日相当	残数
28.5%以上:通期の4週8休	-1

月日	5/27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績																												

①工事名，工事着手日，工事完成
届出日（予定）を入力します。
※カレンダーが自動入力されます。

⑦通期の4週8休の現場閉所率
に対する残り休日数が表示され
ます。
※休日計画の目安に使用してく

	1																											
休暇等		0																										
対象期間		28																										
計画日数		8																										
計画率		28.6%																										
閉所日数		8																										
現場閉所率		28.6%																										
月単位達成		OK																										

①工事名, 工事着手日, 工事完成届出日(予定)を入力します。
 ※カレンダーが自動入力されます。

⑥現場閉所率が自動計算されます。

⑦通期の4週8休の現場閉所率に対する残り休日数が表示されます。
 ※休日計画の目安に使用してください。

1	
休暇等	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	8
現場閉所率	28.6%
月単位達成	OK

月日	6/24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	7/21
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事						④予定している休日を計画欄に入力します。										⑤実際に休んだ休日を実績欄に入力します。 ※雨による休日もブルダウンリストから選択します。												
休暇等																												
計画							休	休					休	休						休	休						休	休
実績							休	休					休	休	雨					休	休						休	休

④予定している休日を計画欄に入力します。

⑤実際に休んだ休日を実績欄に入力します。
 ※雨による休日もブルダウンリストから選択します。

2	
休暇等	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	9
現場閉所率	32.1%
月単位達成	OK

月日	7/22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	③夏季休暇，年末年始休暇，工 事中止をブルダウンリストから 選択し，入力します。										11	12	13	14	15	16	17	8/18
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金											土	日	月	火	水	木	金	土
行事																														
休暇等																														
計画																														
実績																														

③夏季休暇, 年末年始休暇, 工事中止をブルダウンリストから選択し, 入力します。

夏休 夏休 夏休

3	
休暇等	3
対象期間	25
計画日数	8
計画率	32.0%
閉所日数	7
現場閉所率	28.0%
月単位達成	NG

月日	8/19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9/15
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画						休	休						休	休						休	休					休	休	
実績			雨	雨									休	休							休	休					休	休

4	
休暇等	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	8
現場閉所率	28.6%
月単位達成	OK

月日	9/16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10/13
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績		雨		雨		休	休						休	休			雨			休	休						休	休

5	
休暇等	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	8
現場閉所率	28.6%
月単位達成	OK

月日	10/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11/10	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
行事																													
休暇等																													
計画						休	休						休	休						休	休	⑨対象期間において、全ての月							
実績						休	休					休	休			雨	雨												

⑨対象期間において, 全ての月(28日間)毎に週休2日(28.5%)以上の取組を達成した場合は, 補正係数を変更。(一般土木事業)

6	
休暇等	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	9
現場閉所率	32.1%
月単位達成	OK

月日	11/11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		(28日間)毎に週休2日(28.5%) 上の取組を達成した場合は、補 係数を変更。(一般土木事業)									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日										
行事																															
休暇等																															
計画 実績						休	休		雨	雨			休	休			雨			休	休								休	休	

7	
休暇等	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	8
現場閉所率	28.6%
月単位達成	OK

月日	12/9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	1/5
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
休暇等																												
計画																												
実績																												

②工事完成届出日以降は消去します。

冬休 冬休 冬休 冬休 冬

8	
休暇等	6
対象期間	22
計画日数	7
計画率	31.8%
閉所日数	7
現場閉所率	31.8%
月単位達成	OK

月日	1/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
行事																											
休暇等																											
計画																											
実績																											

⑧最終月において、暦上の土曜日・日曜日の閉所では、28.5%に満たない場合は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っていただくものとします。

⑧最終月において, 暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない場合は, その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に, 4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみ

9	
休暇等	0
対象期間	24
計画日数	6
計画率	25.0%
閉所日数	6
現場閉所率	25.0%
月単位達成	NG

令和7年度 町道半下石線道路改良工事

数量総括表

費目・工種	規格1	規格2	摘要	単位	数量	備考
道路改良						
道路土工						
掘削工						
掘削（土砂）						
土砂掘削（片切掘削）				m ³	179.64	
土砂掘削（オーブソカット）押土無し	障害無し		5,000m ³ 未満/工事	m ³	99.58	
路体盛土	施工幅員2.5m未満			m ³	3.02	
法面整形工						
法面整形（切土部）						
切土部法面整形	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	現場制約無し		m ²	239.05	
法面整形（盛土部）						
盛土部法面整形	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	締固め有り、現場制約無し		m ²	31.93	
残土処理工						
残土処理						
積込（ルーズ）	土砂	土量50,000m ³ 未満		m ³	179.64	
土砂運搬（標準）	運搬距離2.0km超3.0km以下、DID無し	積込：ハッパ約山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）		m ³	276.20	
整地（残土受入れ地での処理）				m ³	276.20	
法面工						
植生工						
種子散布						
種子散布工	100m ² 以上250m ² 未満	通常の場合		m ²	194.39	
メンテナンスフリー工						
張りコンクリート工						
張りコンクリート（防草コンクリート）	人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	型枠（38.7+32.0）×0.1		式	1.00	A=76.58m ²
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版取壊し						
アスファルト舗装版破碎	舗装版厚15cm以下、障害等無し	震動騒音対策不要 積込作業有り		m ²	340.01	
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版厚15cm以下			m	11.60	
運搬処理工						
殻運搬処理						
殻運搬舗装版破碎	運搬距離6.0km超7.5km以下、DID無し	機械積込（対策不要、t=15cm超）又は（要対策）		m ³	17.00	
舗装工						

令和7年度 町道半下石線道路改良工事

数量総括表

費目・工種	規格1	規格2	摘要	単位	数量	備考
アスファルト舗装工						
下層路盤						
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-40	1層施工		m ²	386.78	
上層路盤						
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石 M-30	1層施工		m ²	386.78	
表層						
表層(車道・路肩部)W=3.0m超	t=50mm, 密粒度As(再生)	密度2.35t/m ³ , プライムコート PK-3	As合材200t未満/工事(通常時間帯)	m ²	386.78	
コンクリート舗装工						
上層路盤						
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石 M-40	1層施工		m ²	39.70	
表層						
コンクリート舗装工	t=10cm			m ²	39.70	
防護柵工						
路側防護柵工						
ガードレール						
ガードレール設置工(コンクリート建込)	GR-C-4E	塗装仕上げ		m	15.00	
張りコンクリート	ガードレール部分	t=10cm		m	15.00	
ガードパイプ						
ガードパイプ設置工(土中建込)	GP-CP-2E			m	6.00	
準備費						
木根等処分費						
伐採 杉	現場傾斜度30度未満	50cm以上 針葉樹	4週8休(通期)	本	2.00	
ダンプトラック運搬(伐採根)	運搬距離5km	DT4t積		台	1.00	
処分費(準備費内)						
産業廃棄物受入料	伐採木枝	4t車		台	1.00	

[土量計算書] 令和7年度 町道半下石線道路改良工事

測 点	点 間 距 離	片切掘削			オープンカット			盛土W<1			切土法面整形			張コンクリート (右) (t=7cm)			種子散布工			盛土法面整形		
		断 面	平 均	容 積	断 面	平 均	容 積	断 面	平 均	容 積	断 面	平 均	容 積	断 面	平 均	容 積	断 面	平 均	容 積	断 面	平 均	容 積
BP-7.0					0.70																	
BP	7.000		0.00	0.00	0.70	0.70	4.90		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
SP-1	4.663		0.00	0.00	0.70	0.70	3.26		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
EC-1	5.554		0.00	0.00	0.70	0.70	3.89		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
No.1	9.783		0.00	0.00	0.80	0.75	7.34		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
BC-2	3.686		0.00	0.00	0.90	0.85	3.13		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
SP-2	12.514		0.00	0.00	1.20	1.05	13.14		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
No.2	3.800		0.00	0.00	1.30	1.25	4.75		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
No.2 [〃]			0.00	0.00	1.30	1.30	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
EC-2	8.714	6.80	3.40	29.63	1.00	1.15	10.02	0.10	0.05	0.44	8.90	4.45	38.78	1.50	0.75	6.54	7.40	3.70	32.24	1.00	0.50	4.36
BC-3	9.228	4.00	5.40	49.83	0.70	0.85	7.84	0.10	0.10	0.92	3.90	6.40	59.06	1.50	1.50	13.84	2.40	4.90	45.22	1.00	1.00	9.23
SP-3	3.614	4.90	4.45	16.08	0.70	0.70	2.53		0.05	0.18	4.20	4.05	14.64	1.50	1.50	5.42	2.70	2.55	9.22	1.00	1.00	3.61
EC-3	3.614	3.60	4.25	15.36	0.90	0.80	2.89		0.00	0.00	5.70	4.95	17.89	1.50	1.50	5.42	4.20	3.45	12.47	1.00	1.00	3.61
No.3+12.0	6.830	8.90	6.25	42.69	1.20	1.05	7.17		0.00	0.00	9.30	7.50	51.23	1.40	1.45	9.90	7.90	6.05	41.32		0.50	3.42
BC-4	5.045	0.90	4.90	24.72	2.30	1.75	8.83	0.10	0.05	0.25	8.50	8.90	44.90		0.70	3.53	8.50	8.20	41.37	1.00	0.50	2.52
No.4	2.955		0.45	1.33	1.30	1.80	5.32	0.10	0.10	0.30		4.25	12.56		0.00	0.00		4.25	12.56	1.00	1.00	2.96
SP-4	2.227		0.00	0.00	1.10	1.20	2.67		0.05	0.11		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.30	0.65	1.45
EC-4	5.183		0.00	0.00	0.90	1.00	5.18	0.10	0.05	0.26		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.15	0.78
No.4+13.0	5.590		0.00	0.00	1.50	1.20	6.71	0.10	0.10	0.56		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
合 計	100.000			179.64			99.58			3.02			239.05			44.65			194.39			31.93

残土 179.64 + 99.58 - 3.02 = 276.20 m³


[土量計算書]

測 点	点 間 距 離	張コンクリート (左) (t=7cm)			舗装工			舗装版破碎											
		断 面	平 均	容 積	断 面	平 均	容 積	断 面	平 均	容 積	断 面	平 均	容 積	断 面	平 均	容 積	長 さ	平 均	面 積
BP-7.0					2.87			2.87											
BP	7.000		0.00	0.00	2.87	2.87	20.09	2.87	2.87	20.09									
SP-1	4.663		0.00	0.00	2.87	2.87	13.38	2.87	2.87	13.38									
EC-1	5.554		0.00	0.00	2.85	2.86	15.88	2.85	2.86	15.88									
No.1	9.783		0.00	0.00	3.38	3.12	30.47	3.38	3.12	30.47									
BC-2	3.686		0.00	0.00	3.42	3.40	12.53	3.42	3.40	12.53									
SP-2	12.514		0.00	0.00	4.37	3.90	48.74	4.37	3.90	48.74									
No.2	3.800		0.00	0.00	5.30	4.84	18.37	5.30	4.84	18.37									
No.2´			0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	5.30	0.00									
EC-2	8.714	1.00	0.50	4.36	4.00	4.65	40.52	4.02	4.66	40.61									
BC-3	9.228	1.00	1.00	9.23	4.00	4.00	36.91	2.75	3.39	31.24									
SP-3	3.614	1.00	1.00	3.61	4.00	4.00	14.46	2.65	2.70	9.76									
EC-3	3.614	1.00	1.00	3.61	4.00	4.00	14.46	2.39	2.52	9.11									
No.3+12.0	6.830		0.50	3.42	4.00	4.00	27.32	2.34	2.37	16.15									
BC-4	5.045	1.00	0.50	2.52	4.00	4.00	20.18	2.76	2.55	12.86									
No.4	2.955	1.00	1.00	2.96	4.00	4.00	11.82	3.16	2.96	8.75									
SP-4	2.227	0.30	0.65	1.45	4.00	4.00	8.91	3.13	3.15	7.00									
EC-4	5.183		0.15	0.78	4.70	4.35	22.55	3.60	3.37	17.44									
No.4+13.0	5.590		0.00	0.00	6.10	5.40	30.19	6.28	4.94	27.61									
合 計	100.000			31.93			386.78			340.01			0.00			0.00			0.00

令和7年度 町道半下石線道路改良工事
建設副産物処分位置 及び 距離

1. AS・CO殻処分場
南隅碎石(有)

運搬距離L=7.4km

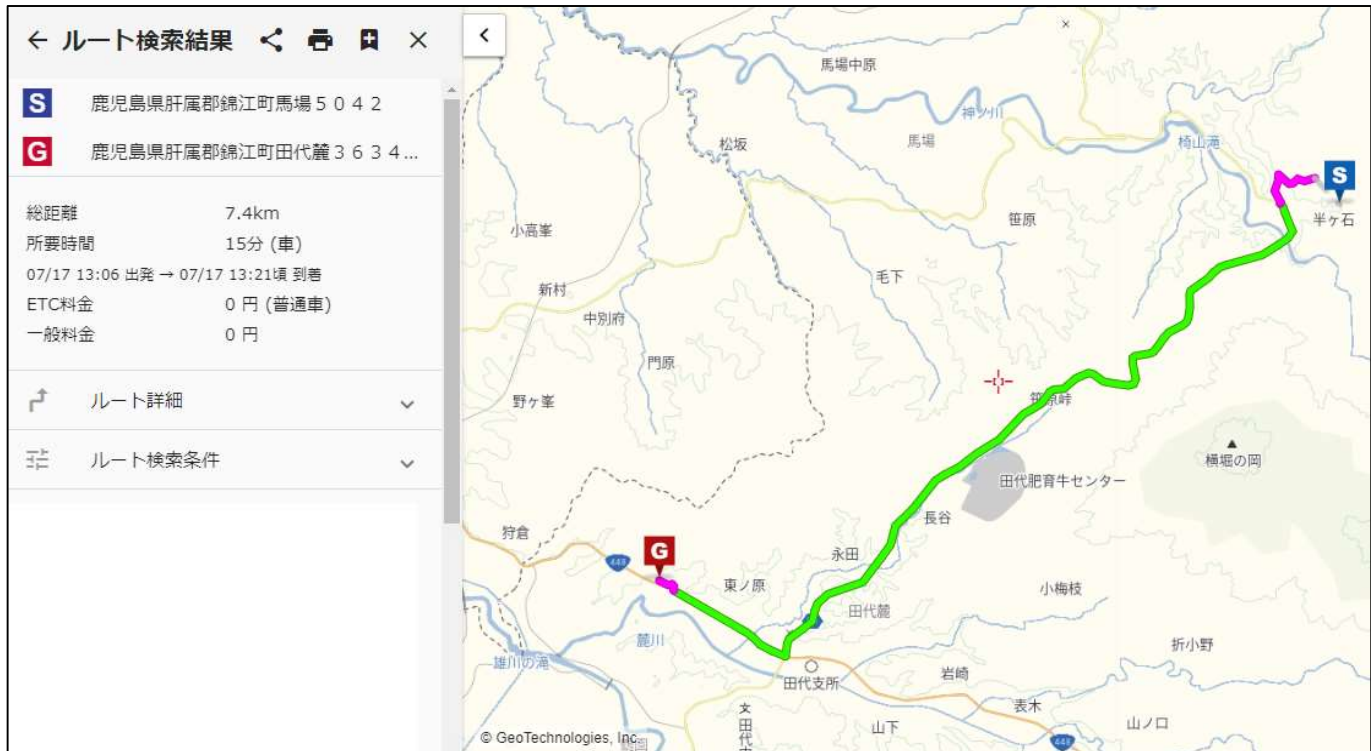

2. 木根等処分場
南隅碎石木くずリサイクル事業部

運搬距離L=4.6km

